Rahmenterminplan BÜ 210,1

Nr.	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Fertig stellen
1	**Entscheidungsfindung**			**24.07.2014**
2	Entscheidung der Stadt LuWi zur Variante bis			24.07.2014
3				
4	**Angebotsabgabe**			**26.08.2014**
5	Angebotsabgabe für die Erstellung der EP und der GP bis			26.08.2014
6				
7	**Erstellung GP**	**100 Tage**	**15.09.2014**	**30.01.2015**
8	Erstellung GP Kreuzungsbereich / BÜSA (nur Kabeltiefbau und Tiefbau zum Stellen der Ausrüstungsteile und des Schalthauses) für Plangenehmigung	100 Tage	15.09.2014	30.01.2015
9	Erstzellung GP Straßenknoten / BÜSTRA für Planfeststellung	100 Tage	15.09.2014	30.01.2015
10				
11	**Erstellung EP**	**121 Tage**	**15.09.2014**	**28.02.2015**
12	Erstellung EP Kreuzungsbereich BÜSA	121 Tage	15.09.2014	28.02.2015
13	Erstellung EP Straßenknoten BÜSTRA	121 Tage	15.09.2014	28.02.2015
14				
15	**Einreichung GP**	**33 Tage**	**02.02.2015**	**17.03.2015**
16	Vorprüfung und Einreichung GP Kreuzungsbereich / BÜSA beim EBA	33 Tage	02.02.2015	17.03.2015
17	Vorprüfung und Einreichung GP Straßenknoten / BÜSTRA beim EBA	33 Tage	02.02.2015	17.03.2015
18				
19	**Übergabe GP**	**76 Tage**	**18.03.2015**	**01.07.2015**
20	Prüfung EBA und Übergabe GP Straßenknoten / BÜSTRA an LVA	76 Tage	18.03.2015	01.07.2015
21				
22	**Bestätigung EP**	**146 Tage**	**02.03.2015**	**21.09.2015**
23	Prüfung und Bestätigung EP Kreuzungsbereich / BÜSA	146 Tage	02.03.2015	21.09.2015
24	Prüfung und Bestätigung EP Straßenknoten / BÜSTRA	146 Tage	02.03.2015	21.09.2015
25				
26	**Plangenehmigung / Planfeststellung**	**396 Tage**	**18.03.2015**	**21.09.2016**
27	Plangenehmigung Kreuzungsbereich BÜSA	265 Tage	18.03.2015	22.03.2016
28	Planfeststellung Straßenknoten / BÜSTRA	320 Tage	02.07.2015	21.09.2016
29				
30	**Erstellung Ausschreibungsunterlage**			**30.11.2015**
31	Erstellung AU Kreuzungsbereich BÜSA bis	30 Tage	22.09.2015	02.11.2015
32	Erstellung AU Straßenknoten / BÜSTRA bis	50 Tage	22.09.2015	30.11.2015
33				
34	**Freigabe Ausschreibungsunterlage**	**40 Tage**	**03.11.2015**	**28.12.2015**
35	Prüfung und Freigabe AU Kreuzungsbereich BÜSA	20 Tage	03.11.2015	30.11.2015
36	Prüfung und Freigabe AU Straßenknoten / BÜSTRA	20 Tage	01.12.2015	28.12.2015
37				
38	**Erstellung PT I**		**22.09.2015**	**16.11.2015**
39	Erstellung PT I (einschl. Prüfung und Freigabe) bis	40 Tage	22.09.2015	16.11.2015
40				
41	**Abruf / Bestellung BÜSA**	**26 Tage**	**13.11.2015**	**18.12.2015**
42	Angebotsabfrage und -erstellung BÜSA nach RV	7 Tage	13.11.2015	23.11.2015
43	Angebotsprüfung und Abrufbestellung BÜSA nach RV	20 Tage	23.11.2015	18.12.2015
44				
45	**Ausschreibung**	**124 Tage**	**01.12.2015**	**20.05.2016**
46	Ausschreibung Kreuzungsbereich / BÜSA und Versand bis Submission	30 Tage	01.12.2015	11.01.2016
47	Ausschreibung Straßenknoten / BÜSTRA und Versand bis Submission	70 Tage	15.02.2016	20.05.2016
48				
49	**Erstellung PT II**	**51 Tage**	**18.12.2015**	**26.02.2016**
50	Erstellung PT II (einschl. Prüfung und Freigabe)	51 Tage	18.12.2015	26.02.2016
51				
52	**Vergabe**	**187 Tage**	**14.01.2016**	**30.09.2016**
53	Vergabe Kreuzungsbereich / BÜSA und Submission bis Beauftragung	60 Tage	14.01.2016	06.04.2016
54	Vergabe Straßenknoten / BÜSTRA und Submission bis Beauftragung	95 Tage	23.05.2016	30.09.2016
55				
56	**Erstellung AP Bau**	**41 Tage**	**07.04.2016**	**02.06.2016**
57	Erstellung AP Bau Kreuzungsbereich / BÜSA	32 Tage	07.04.2016	20.05.2016
58	Prüfung und Freigabe AP Bau Kreuzungsbereich / BÜSA	9 Tage	23.05.2016	02.06.2016
59				
60	**Bau / Montage**	**45 Tage**	**06.06.2016**	**05.08.2016**
61	Bau und Montage BÜSA	45 Tage	06.06.2016	05.08.2016
62				
63	**Erstellung AP Bau (Straßenknoten)**	**57 Tage**	**03.10.2016**	**20.12.2016**
64	Erstellung AP Straßenknoten / BÜSTRA	36 Tage	03.10.2016	21.11.2016
65	Prüfung und Freigabe AP Bau Straßenknoten / BÜSTRA	21 Tage	22.11.2016	20.12.2016
66				
67	**Bau / Montage Straßenknoten**		**22.12.2016**	**19.05.2017**
68	Bau und Montage Straßenknoten / BÜSTRA ab	107 Tage	22.12.2016	19.05.2017

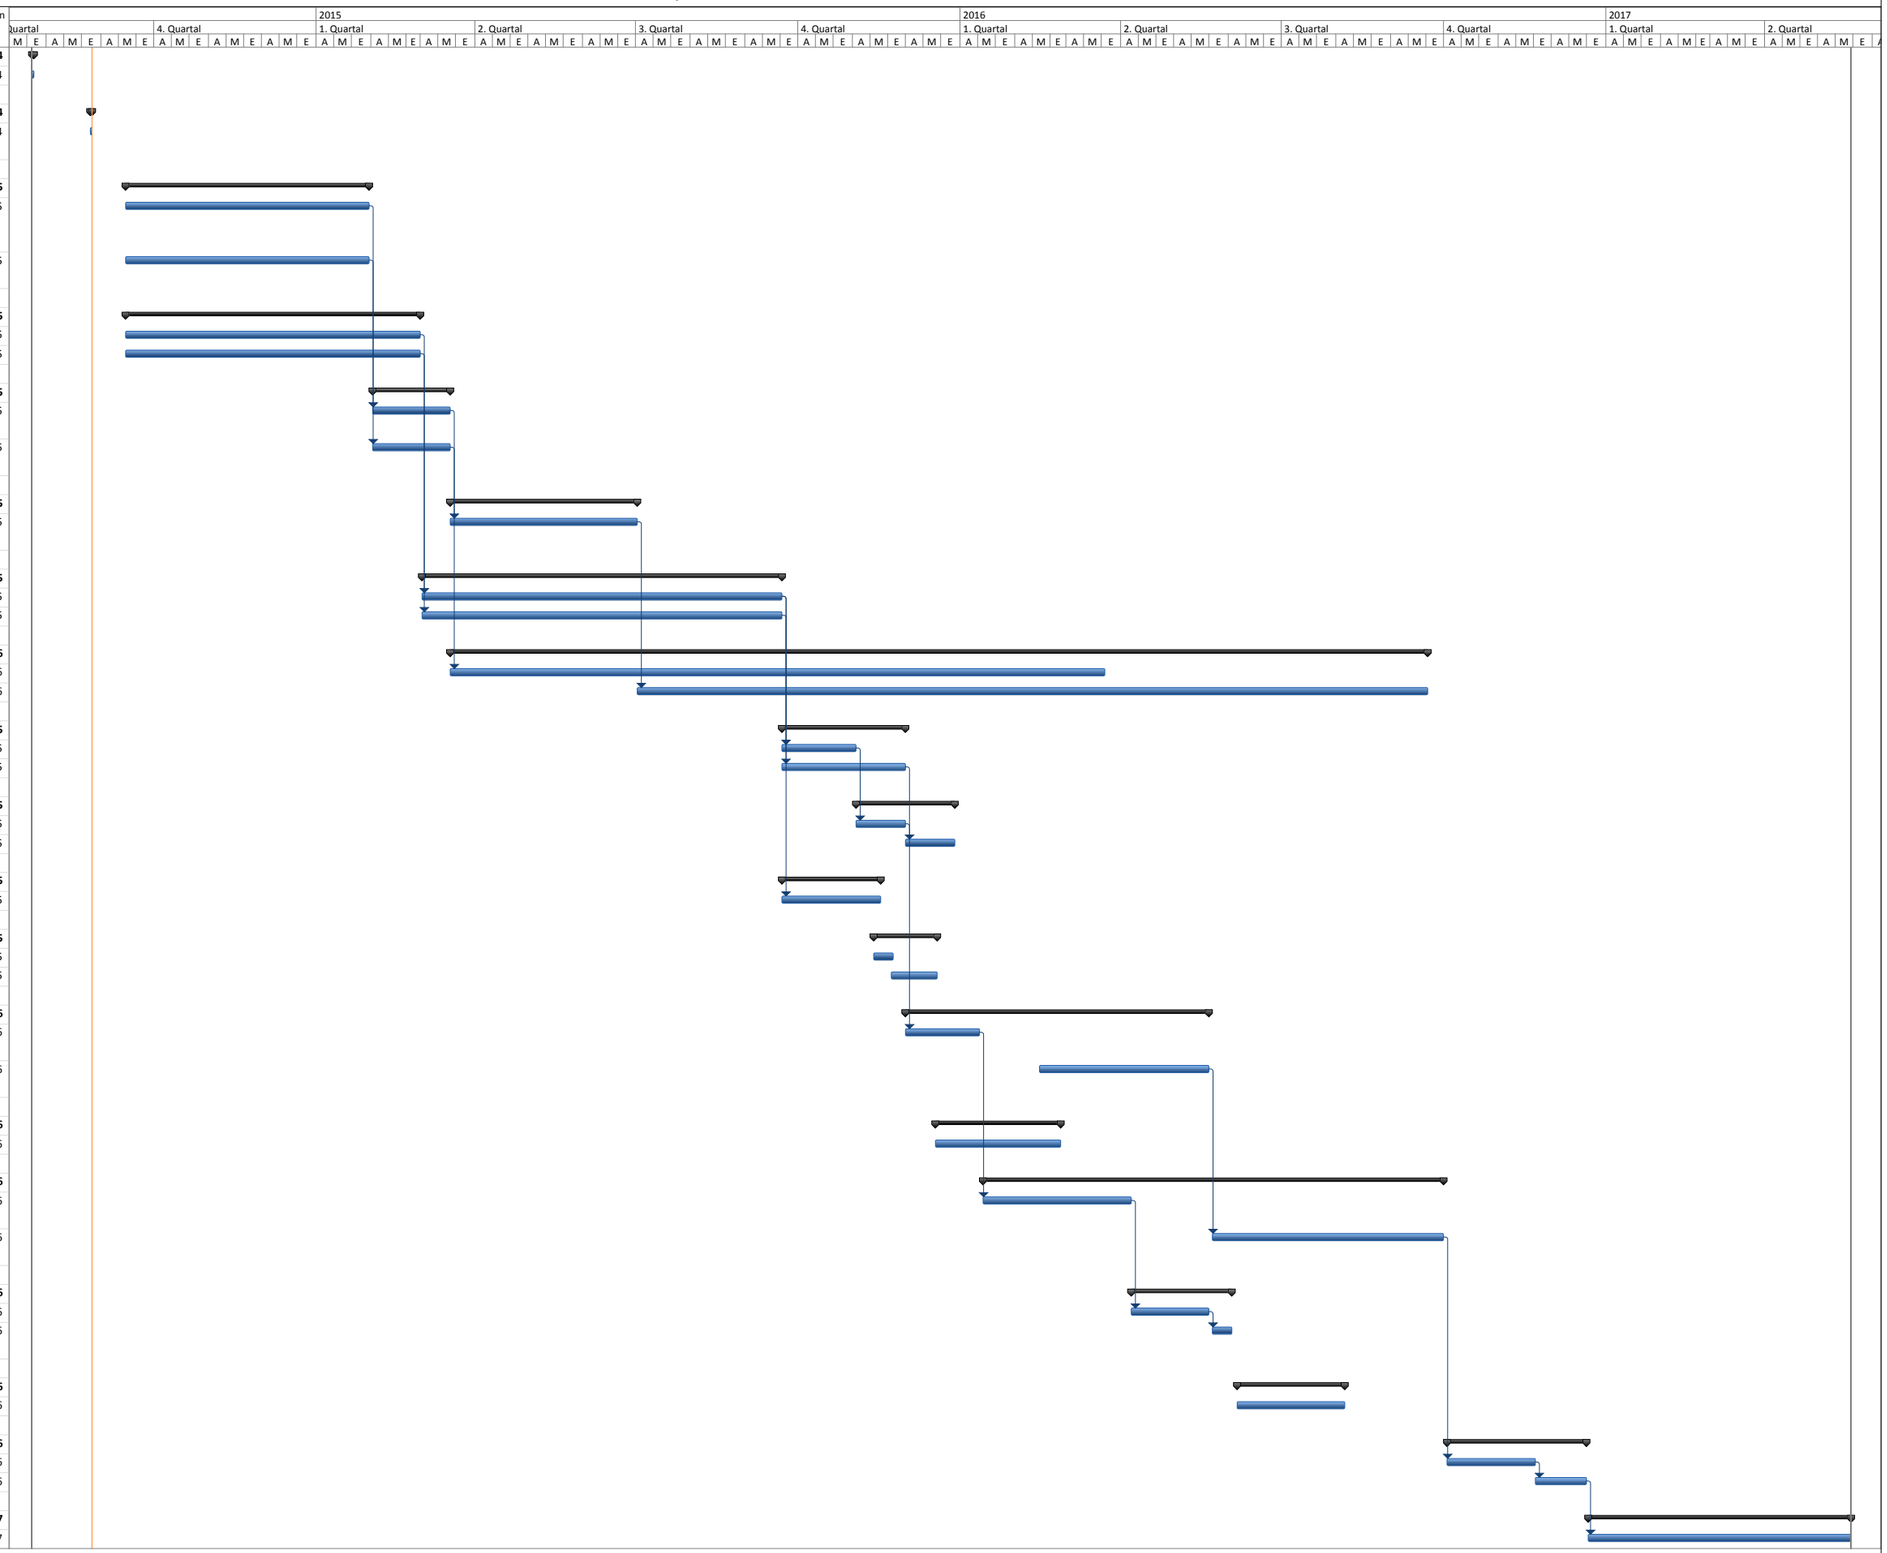

Projekt: RTP_BÜ210,1_140826
Datum: 27.08.2014

Vorgang · Unterbrechung · Meilenstein · Sammelvorgang · Projektsammelvorgang · Externe Vorgänge · Externer Meilenstein · Inaktiver Vorgang · Inaktiver Meilenstein · Inaktiver Sammelvorgang · Manueller Vorgang · Nur Dauer · Manueller Sammelrollup · Manueller Sammelvorgang · Nur Anfang · Nur Ende · Stichtag · In Arbeit
